

Notizen Bestandsaufnahme Küche Jugendkeller Kirche Jungfernkopf, 10.05.2024 (Thorsten Hahn, Oliver Höppner)

Ausstattung der Küche mit Elektrogeräten:

Aktuell gibt es nur einen Backofen mit Ober- und Unterhitze sowie Umluft (ist relativ neu!) und ein Ceran-Kochfeld. Eine Spülmaschine ist nicht vorhanden, eine Mikrowelle auch nicht. Der Kühlschrank steht im Nachbarraum und ist derzeit nicht in die Küche integriert. Zudem ist der Kühlschrank bereits älter und innen schimmelig.

Ausstattung der Küche mit Geschirr, Besteck und Kochgeschirr/Kochbesteck

Die Ausstattung der Küche ist insgesamt unzureichend. Vorhanden ist ein wahlloses Sammelsurium aus verschiedensten Epochen, welches kreuz und quer in den Schränken wenig systematisch gelagert ist. Manches taugt noch was, vieles aber hat aber seine Zeit auch schon überlebt und sollte ersetzt werden. Dies betrifft auch das Kochgeschirr sowie das Kochbesteck. Es sollte auch hier über Neuanschaffungen nachgedacht werden.

Spüle:

Die Spüle ist abgängig und muss ersetzt werden. Ebenso die Armatur.

Fliesenspiegel:

Der Fliesenspiegel sollte entfernt werden. Er ist alt und verblichen und farblich nicht mehr aktuell.

Warmwasser:

Wird aktuell mit einem völlig veralteten Boiler erzeugt. Zudem ist der Wasserdurchlauf eingeschränkt. Das Zulaufrohr (Abgang vom Hauptrohr) muss somit überprüft werden, ob es sich ggf. zugesetzt hat.

Abwasser:

Das Abwasser läuft in einen Bodeneinlauf auf der linken Seite an der Wand. Dieser kann weiter genutzt werden. Änderungen sind keine erforderlich.

Beleuchtung der Küche/Arbeitsplatte:

Eine Beleuchtung ist nicht vorhanden. Die vorhandene Raumbeleuchtung ist für die Beleuchtung der Arbeitsflächen/Arbeitsplatte der Küche unzureichend.

Abbau und Entsorgung der alten Küche:

Der Abbau kann vollständig in Eigenleistung erfolgen. für die Entsorgung des Altholz etc. kann der Anhänger der Kirche genutzt werden (Fahrt zum Wertstoffhof). Auch dies kann in Eigenleistung erfolgen. Die Entsorgungskosten werden bei ca. 50€ liegen. Fraglich ist, ob auch der alte Kühlschrank gleich mit entsorgt werden soll.

Tresenelement:

Das Tresenelement ist in Ordnung und sollte weitestgehend erhalten bleiben. Es erfüllt u.a. den Zweck einer Durchreiche und separiert die Küche vom restlichen Raum. Dies ist ein Vorteil. Der Fliesenbelag ist jedoch abgängig und sollte erneuert werden, ggf. durch eine normale Arbeitsplatte. Außerdem sollte das Tresenelement gekürzt werden, so dass auf der linken Seite noch ein Schrank hinpasst (oder ggf. ein Gefrierschrank oder weitere Kühlschrank, welcher bei Bedarf dann noch mit genutzt werden kann, z.B. bei Festen auf der Kirchwiese)

Dach über Tresenelement:

Das Dach sollte komplett entfernt werden. Es ist mittlerweile schäbig und unansehnlich. Die Entfernung kann in Eigenleistung einfach erfolgen, ggf. bereits auch zeitnah, als einleitende Maßnahme.

Im Anschluss kann der Bereich dann (in Eigenleistung) mit Gipskartonplatten verkleidet werden und es können nach unten zum Tresenelement hin LED-Strahler angebracht werden. Dies würde den Raum insgesamt, die Durchreiche und somit auch die Küche enorm aufwerten und ansehnlicher machen.

Fußboden:

Grauer Linoleum. Grundsätzlich noch in Ordnung. Keine Veränderungen erforderlich.

Dunstabzug/Lüftung:

Der installierte Dunstabzug/Lüftung ist voll funktionsfähig und kann weiterhin genutzt werden.

Ausblick:**Ausstattung der Küche:**

- Backofen und Cerankochfeld (vorhanden).
- Kühlgefrierkombination, integriert in die Küche (präferiert auf der linken Seite).
- Spülmaschine
- Durchlauferhitzer für die Warmwassererzeugung
- Mikrowelle
- Zweifach-Spülbecken (mit ausreichend tiefen Spülbecken), Armatur (mit herausziehbarer Geschirrbrause)
- LED-Beleuchtung der Arbeitsbereich/Arbeitsplatte
- Ober- und Unterschränke mit ausreichend Abstellmöglichkeiten für Geschirr etc. sowie Schubladen für Besteck.
- Ggf. ausziehbarer Tisch (aus einem der Unterschränke), um Arbeitsplatte bei Bedarf zu erweitern.


Durch Fachunternehmen zu erledigende Arbeiten:

- Überprüfung und Herstellung Wasseranschluss (abgehend von der Hauptzuleitung im Nachbarraum): Installateur
- Anschluss Durchlauferhitzer für die Warmwasseraufbereitung: Elektriker
- Herstellung Anschluss für Spülmaschine: Installateur.

Umbaustart und ungefährer Ablauf:

- Entfernung Dach über Tresenelement, Bearbeitung Tresenelement, Installation neue Gipskartonplatten inkl. LED-Beleuchtung: Juni 2024 (noch vor Sommerfest, 6.7.2024), Erledigung in Eigenleistung.
- Entfernung der alten Küche: Direkt nach dem Sommerfest (also ab 7.7.2024), in Eigenleistung.
- Entfernung alter Fliesenspiegel: Direkt nach dem Sommerfest, in Eigenleistung.
- Handwerkerarbeiten am Wasser (Wasserzuleitung, Durchlauferhitzer, Wasseranschluss Spüle und Spülmaschine): Sommer 2024.
- Streichen der Wände im Küchenbereich (nach Handwerkerarbeiten). In Eigenleistung.
- Installation neue Küche (in Eigenleistung). Statt Fliesenspiegel wird eine Küchenrückwand/Wandpanel montiert (in Eigenleistung).
- Fertigstellung der Installationsarbeiten bis Mitte November. Offizielle Einweihung der Küche zum Weihnachtsbasar.

Maße:

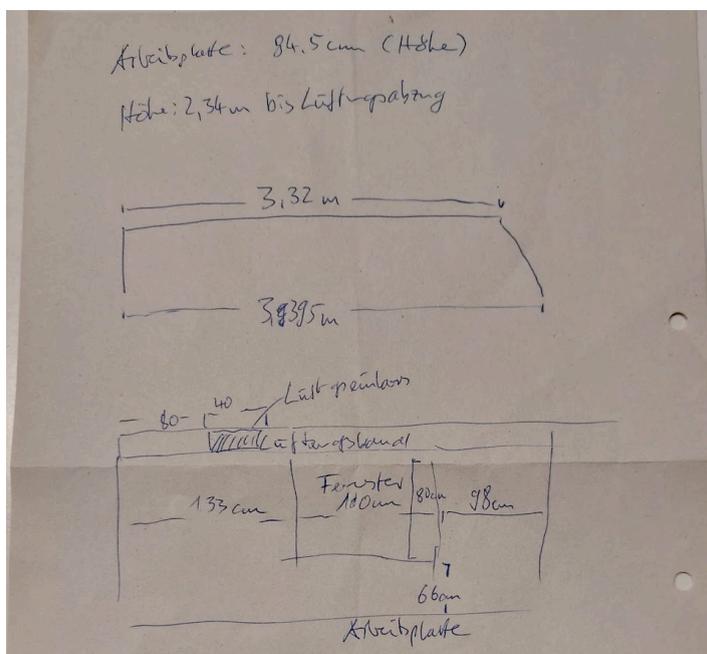

Fotos:

Abwasserbodeneinlauf:



Abwasser unter Spüle:



Wasserzulauf:



Dunstabzug/Lüftung:



Stromanschlüsse Arbeitsbereiche:





Abzweigdose Strom:



Gesamtansicht:



